Fiche d'Information de livraison de piscines coques

avec grue grande capacité - camion 8×4 (convoi exceptionnel)




Cette fiche d'information est destinée aux revendeurs de piscines coques utilisant le service de livraison par grue de notre réseau de professionnels. Elle détaille les particularités de notre équipement en tant que convoi exceptionnel de Catégorie 1 et les préconisations essentielles à respecter pour garantir la faisabilité et la sécurité de chaque opération de livraison.

Notre ensemble de livraison (Convoi Exceptionnel)

Nous mettons à votre disposition un équipement spécialisé pour la livraison et la mise en place de piscines coques :

- Capacité de grue : 1 tonne à 31 mètres de portée
- Classification : Transport exceptionnel Catégorie 1
- Configuration : Camion 8×4 équipé grue montée
- Dimensions convoi : 19.50 m de longueur, largeur 3 m

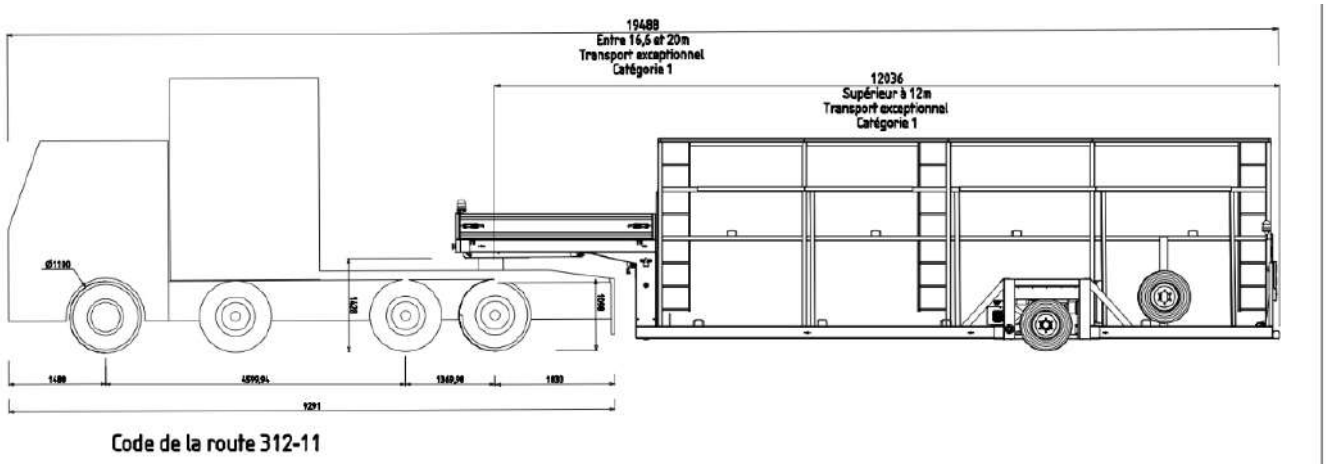

Conditions d'accès obligatoires avant intervention

La livraison grande grue est une opération technique. Toute contrainte non déclarée peut rendre la pose impossible et engager une facturation de la prestation.

Checklist technique minimale

1. Accès et circulation

- Route / chemin : 4,50 m minimum de largeur utile.
- Zone de manoeuvre : 10 m recommandés.
- Hauteur libre sous obstacles : 4,80 m minimum.

2. Portance et stabilité du sol

- Sol stabilisé supportant 32 tonnes en charge.
- Absence de canalisations, fosses septiques, regards fragiles ou réseaux enterrés non déclarés.
- Surface plane, compacte et stable pour les stabilisateurs.

3. Béquillage et sécurisation

- Périmètre libre de 9 x 8 m minimum autour du véhicule.
- Sol compacté ou dalle béton recommandé.
- Pente maximale admissible : 3 %.

4. Distances de sécurité

- 5 m minimum des constructions existantes.
- 5 m minimum des lignes électriques aériennes.
- 3 m minimum des arbres, murs et obstacles latéraux.



Photo illustrative - grue de grande capacité en déploiement

Responsabilités revendeur

- Valider l'accessibilité du site avant commande.
- Transmettre photos / vidéos de l'accès, zone de pose et obstacles.
- Obtenir les autorisations de circulation ou de stationnement.
- Informer les riverains en cas de gêne ou passage délicat.
- Confirmer l'absence de réseaux enterrés dans la zone de béquillage.

Validation préalable : accès, sol, obstacles, réseaux et distances de levage confirmés avant envoi du camion.

Coût et conditions commerciales

Tarif prestation

400 € HT

En supplément du tarif de livraison standard.

Prestations incluses

- Transport et positionnement de la coque.
- Déploiement de la grue et sécurisation de la zone de levage.
- Intervention sous réserve de conformité du site.

Non inclus / à anticiper

- Autorisations de voirie ou travaux d'accès.
- Terrassement, reprise de sol ou plaques de répartition spécifiques.
- Attente ou immobilisation non prévue le jour J.

En cas de non-conformité des accès, de la zone de béquillage ou des informations transmises, la prestation est facturée même si la mise en place ne peut pas être réalisée.

Nom / societe / date

Signature / accord
